

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

釜屋地区

釜屋第1橋(仮称)、釜屋第2橋(仮称)の背骨である主桁の架設が完了しました。
工場で製作した主桁を現場で組み立て、クレーンで吊り上げて架設しました。
今後は車が通る走行面を施工し、令和5年の春に完成予定です。



新釜屋トンネル(仮称)

新釜屋トンネル(仮称)の掘削を令和4年9月から開始しました。
その後、順調に工事が進んでいます。
貫通後はトンネル掘削面を覆う覆工コンクリートを施工し、令和5年の春に完成予定です。




諸寄地区

令和4年8月から開始した諸寄浄化センター奥の切土工事が完成します。
計3段の切土工事が完成し、令和5年の春からトンネル工事に着手する予定です。
工事車両の往来等が活発になりますが、安全第一で工事を進めます。



浜坂第2トンネル(仮称)東工区

浜坂第2トンネル(仮称)建設工事(東工区)では、令和4年12月末時点で掘削延長1,528mのうち、約900mまで掘削が進みました。
令和4年10月からは「スライドセメントル」という特殊な型枠を使ったアーチ部のコンクリート覆工作業が始まり、少しずつトンネルの完成形がイメージ出来るようになってきました。

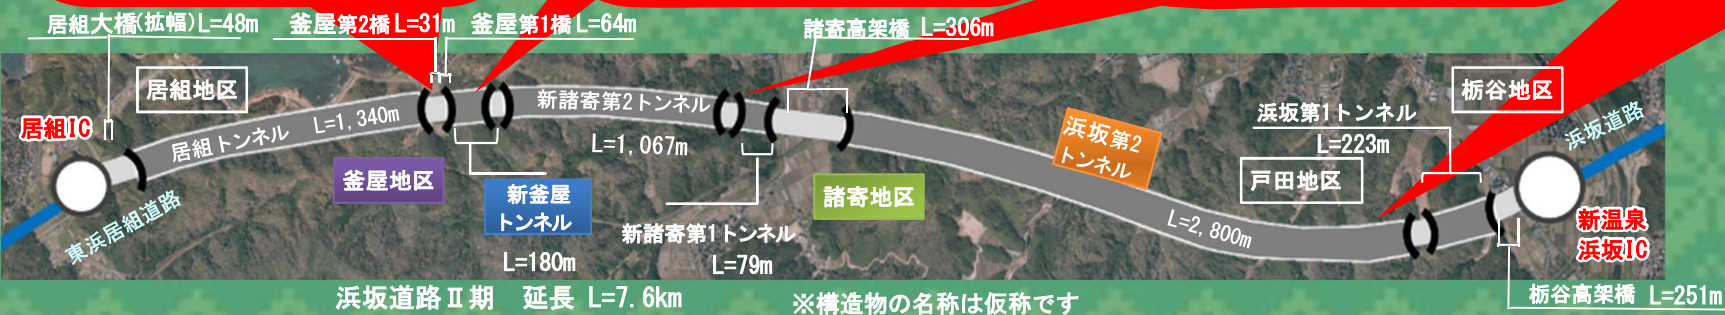

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧ください。
<https://www.facebook.com/shinonen>
