

繼續事業評価調書


【下水道事業】

土木局下水道課

投資事業評価調書(継続：再評価〔第2回〕)

部課室名	県土整備部土木局 下水道課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	下水道課長 谷川 俊男 (寺西 章浩)	内線	4495 (4500)
事業種目	下水道事業	事業採択年度	S53	現計画	再評価時点
事業名	揖保川流域下水道	着工年度	S53	総事業費	約1,440億円
		再評価年度	H10		(更新含む)約1,600億円
事業区間 (関連市町)	姫路市、たつの市、宍粟市、太子町	内用地補償費		約233億円	約233億円
		完成予定年度		H37	H17
所在地 (処理場)	姫路市網干区興浜、網干浜	進捗率(内用補)		89%(100%)	60%(86%)
		残事業費		約160億円 (更新含む)約292億円	
事業の目的			事業内容		
播磨地域における3市1町(姫路市、たつの市、宍粟市、太子町)の下水道整備を効率的に行い、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資することを目的とする。				現計画	再評価時点
			処理面積 (ha)	9,230	8,707
			処理人口 (人)	176,500	221,400
			処理能力 (m ³ /日)	128,000	215,000
			処理水量 (m ³ /日最大)	127,272	213,600
			管渠延長 (km)	52.8	59.7
			ポンプ場 (箇所)	2	2
			負担割合：[処理施設] 国2/3, 県1/6, 関連市1/6 [管渠等] 国1/2, 県1/4, 関連市1/4		
事業を取り巻く社会経済情勢等の変化	<ul style="list-style-type: none"> 過去10年間で、計画処理区域内の現住人口は188.7千人(H9年度末)から191.2千人(H19年度末)へとほぼ横ばいで推移している。 一人当たりの水使用量の伸びは見られないものの、既存工場等の接続率向上による流入水量の増加が見込まれる。 計画処理人口の見直し等による施設計画規模の縮小に伴い、総事業費を減額する。 下水道事業は社会情勢の変化等に伴う流入水量の増加に対応して段階的な施設整備を実施することから、概ね20年後を目標として全体計画を見直したことにより完了予定年度をH37年度に変更している。 				
進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 処理場はS63年に供用開始。現在の処理能力は102,750m³/日。 全関連市が供用済み。姫路市(S63)、たつの市(H5)、宍粟市(H9)、太子町(H3) H19年度処理水量=94,273m³/日 H19年度末の普及率(処理人口/全体計画区域内人口)=97.8% H19年度末の水洗化率(水洗化人口/処理人口)=91.1% 整備済管渠延長=52.8km(整備率=100.0%) 				
評価視点	評価結果の説明				
(1)必要性	<ul style="list-style-type: none"> 普及率は97.8%と比較的高いが、今後、既存工場等の接続率向上に伴う流入水量に見合う施設の増設を行う必要がある。 下水道はほぼ普及しており、整備済みの施設が有効に働いて快適な生活環境を維持していくためにも老朽化施設の適切な改築更新が必要である。 				
(2)有効性・効率性	<ul style="list-style-type: none"> 費用便益比B/C=1.9(残事業B/C=1.4) 事業実施に際しては、流入水量に応じて段階的に建設を進めている。 				
(3)環境適合性	<ul style="list-style-type: none"> 処理場、菅野川・正條ポンプ場では、近隣に一般住宅等があるため、必要に応じて脱臭設備や振動防止装置の設置、吸音材の使用等により悪臭・騒音・振動対策を講じている。 発生する汚泥は送泥管により兵庫西流域下水汚泥広域処理場へ圧送しており、汚泥処理に係る環境への影響はない。 				
(4)優先性	<ul style="list-style-type: none"> 今後も流入水量の増加に対応した事業の実施が必要である。 施設の機能を維持するためには、今後も適切な更新を行う必要がある。 				
再評価の結果	継続	左の理由	事業の必要性は前回再評価時と変わっておらず、引き続き、快適な生活環境と公共用水域の水質保全の確保のため、継続して事業を実施する必要がある。		

揖保川流域下水道 計画一般平面図

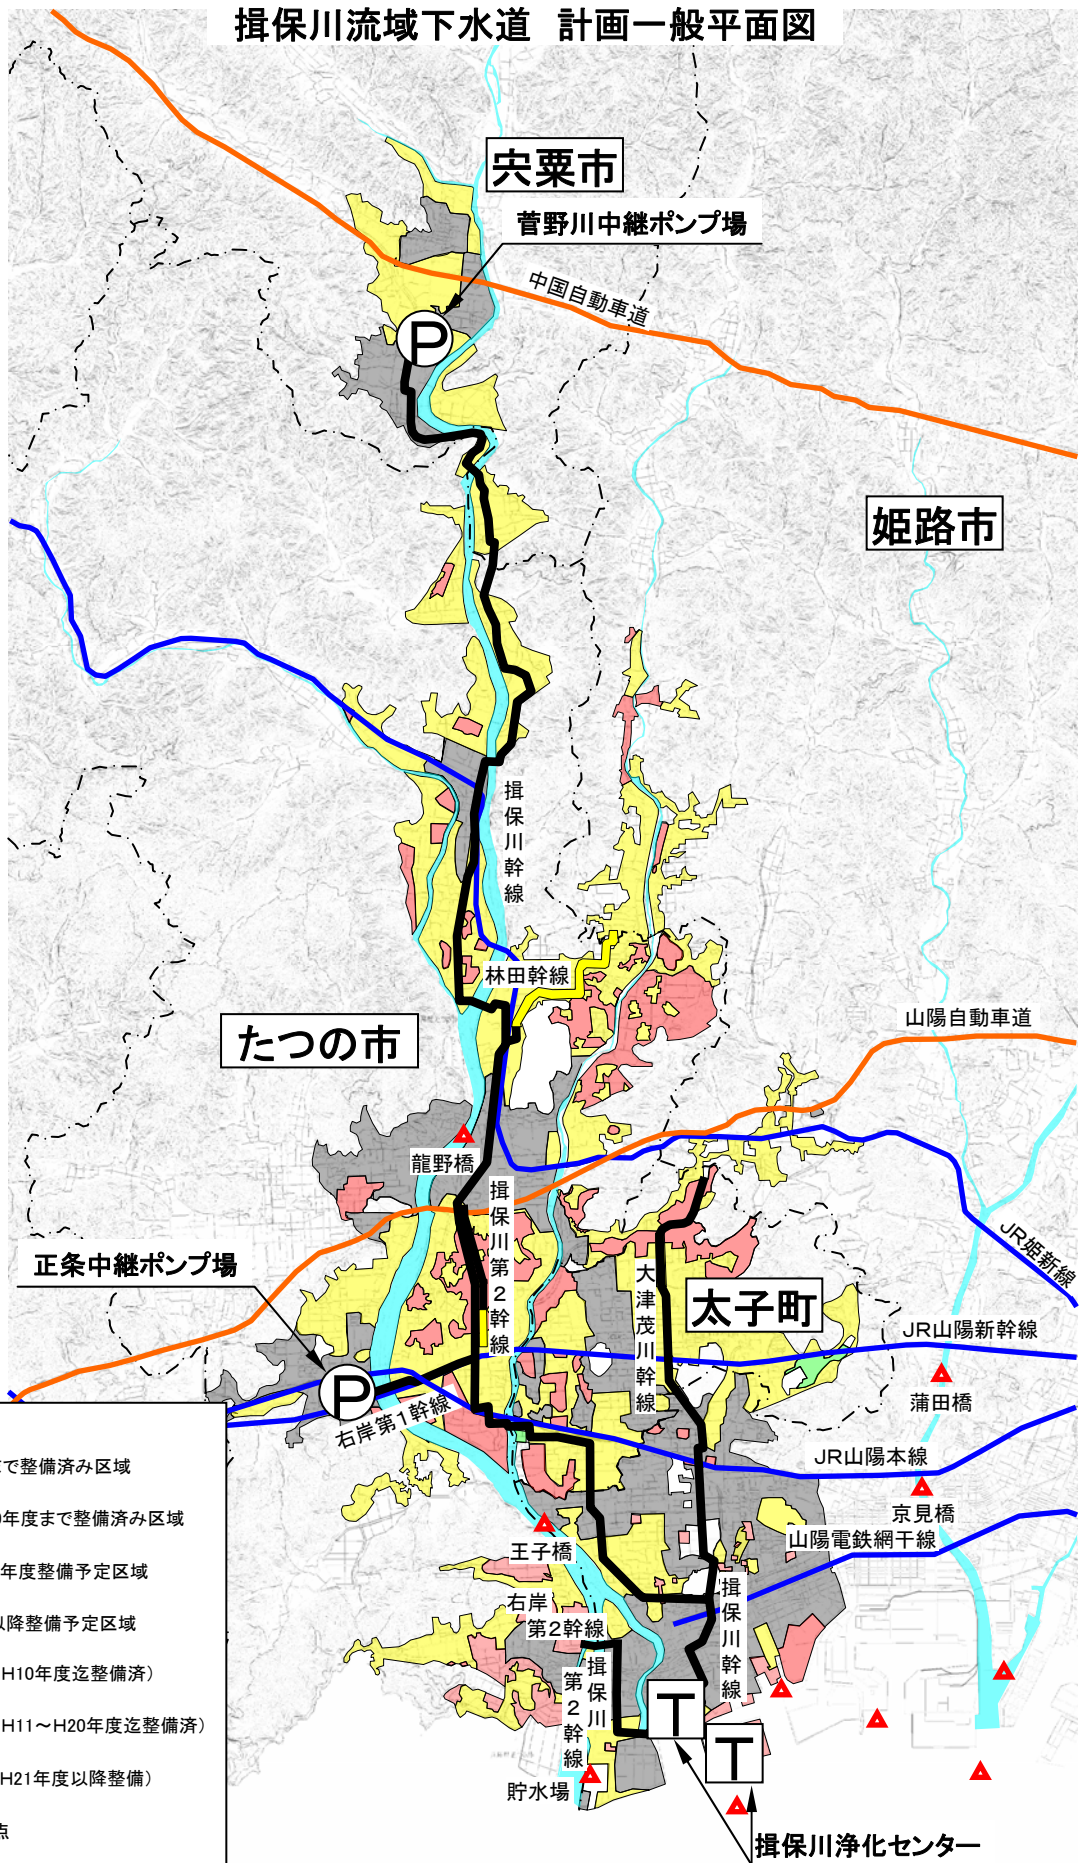

宍粟市

菅野川中継ポンプ場

中国自動車道

姫路市

たつの市

山陽自動車道

正条中継ポンプ場

太子町

JR姫新線

JR山陽新幹線

JR山陽本線

京見橋

山陽電鉄網干線

貯水場

揖保川浄化センター

- 凡 例
- H10年度まで整備済み区域
 - H11～H20年度まで整備済み区域
 - H21～H30年度整備予定区域
 - H31年度以降整備予定区域
 - 流域管渠 (H10年度迄整備済)
 - 流域管渠 (H11～H20年度迄整備済)
 - 流域管渠 (H21年度以降整備)
 - 環境基準点

事業進捗状況調書

	事業進捗状況・予定	整備効果
全体	S53～H37年度【事業費＝1,440億円】（更新含む1,600億円） ・計画処理面積：9,230ha ・計画処理人口：176,500人 ・計画処理水量：127,272m ³ /日最大 ・管渠延長：52.8km ・処理場の水処理能力：128,000m ³ /日	
前回 再評価 まで (実績)	S53～H10年度【事業費＝1,113億円】（更新含む1,114億円） ・処理面積：3,237ha ・処理人口：115,700人 ・処理場の水処理能力：80,500m ³ /日 ・管渠延長：41.5km	普及率(H9年度末) 51.5%
過去 10年間 (実績)	H11～20年度【事業費＝167億円】（更新含む194億円） ・処理面積：6,917ha（3,680haの増加） ・処理人口：187,600人（71,900人の増加） ・処理場の水処理能力：102,750 m ³ /日（22,250m ³ /日の増加） ・管渠延長：52.8km（11.3kmの増加）	普及率(H19年度末) 97.8%
今後 17年間 (予定)	H21～37年度【事業費＝160億円】（更新含む292億円） ・処理面積：9,230ha（2,313haの増加） ・処理人口：176,500人（11,100人の減少） ・処理場の水処理能力：128,000 m ³ /日（25,250m ³ /日の増加） ・管渠延長：52.8km（増減なし）	普及率(H37年度末) 100.0%

今後 10年間 の整備 目標	H21～30年度【事業費＝0億円】（更新含む14億円） ・処理面積：9,106ha（2,189haの増加） ・処理人口：180,900人（6,700人の減少） ・処理場の水処理能力：102,750 m ³ /日（増減なし） ・管渠延長：52.8km（増減なし）	普及率(H30年度末) 99.4%
-------------------------	--	----------------------

揖保川流域下水道 実施及び計画工程

区分	主な工事内容	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
処理場	新設 水処理施設																													
	更新 中央監視設備																													
	更新 水処理施設																													
管渠	新設 揖保川第2幹線																													
	新設 大津茂川幹線																													
	新設 林田幹線																													

揖保川浄化センター



H20.9 撮影

便益（B）の項目

事業	B（便益）		算出方法
下水道	(1)生活環境の改善	①周辺環境の改善効果	下水道事業が実施されない場合に周辺環境の改善効果を得るための代替事業として必要な「中小水路の覆盖費用（維持管理費を含む）」を計上 中小水路延長×覆盖単価+清掃費(ヘドロ除去、薬品散布)
		②居住環境の改善効果	下水道事業が実施されない場合に居住環境の改善効果を得るための代替事業として必要な「浄化槽の設置費用（維持管理費等を含む）」を計上 単独浄化槽(し尿浄化槽)設置基数×設置単価 +維持管理費+敷地占有費+汚泥処理処分費
	(2)公共用水域の水質保全	浚渫事業を代替事業とした水質保全効果	下水道事業と同等の汚濁負荷削減量となる浚渫事業を代替事業として費用を計上 浚渫土砂量×浚渫単価（16,500円/m ³ ） 浚渫土砂量＝下水道整備による削減負荷量(リン換算値) ×リン1g除去に必要な浚渫土砂量（1,429g/g-P） ※リン換算値はCOD, T-N, T-Pをリンに換算して合計したもの。
	(3)浸水の防除		下水道が整備されない場合の浸水被害額を計上 浸水シミュレーション等により、下水道整備による浸水被害軽減額を算出 直接被害:家屋、公共土木施設、農作物 等 間接被害:営業停止損失、家屋等の応急対策費用、交通途絶被害 等
	(4)その他	①下水汚泥の有効利用	下水汚泥や焼却灰を有効利用することにより、処理処分費用が低減できる額を計上 下水汚泥等有効利用量×汚泥等処理処分費用
		②処理場等用地の有効利用	処理場等の未利用地や施設上部空間を公園等に活用できる効果を計上 年度別便益＝有効利用面積×地価×社会的割引率(0.04)

「下水道事業における費用効果分析マニュアル 平成18年11月(社)日本下水道協会」より

費用便益比（B/C）算出根拠

()内は残事業B/C

事業	事業名	B:便益額(百万円)		C:総費用(百万円)										B/C	
				費用(流域下水道)			費用(流域下水汚泥処理)			費用(公共下水道)					
				事業費	維持管理費		事業費	維持管理費		事業費	維持管理費		事業費		維持管理費
下水道	揖保川流域下水道	(1)生活環境の改善効果	①周辺環境の改善効果	428,319 (70,487)	604,996 (77,288)	228,638 (31,596)	185,324 (27,162)	43,314 (4,434)	84,110 (13,544)	47,377 (4,951)	36,732 (8,593)	292,248 (32,149)	252,126 (29,689)	40,122 (2,460)	1.9 (1.4)
			②居住環境の改善効果	280,817 (11,795)											
		(2)公共用水域の水質保全	水質保全効果	410,785 (20,438)											
			(3)浸水の防除	6,336 (0)											
		(4)その他	①下水汚泥の有効利用	(6,694) (1,766)											
			②処理場等用地の有効利用	1,030 (0)											
		合計		1,133,981 (104,486)											
