


継続事業評価調書  
【河川事業】

一級河川 別府川（水田川工区）

土木局 河川整備課

# 加古川水系下流圏域河川整備計画全体概要

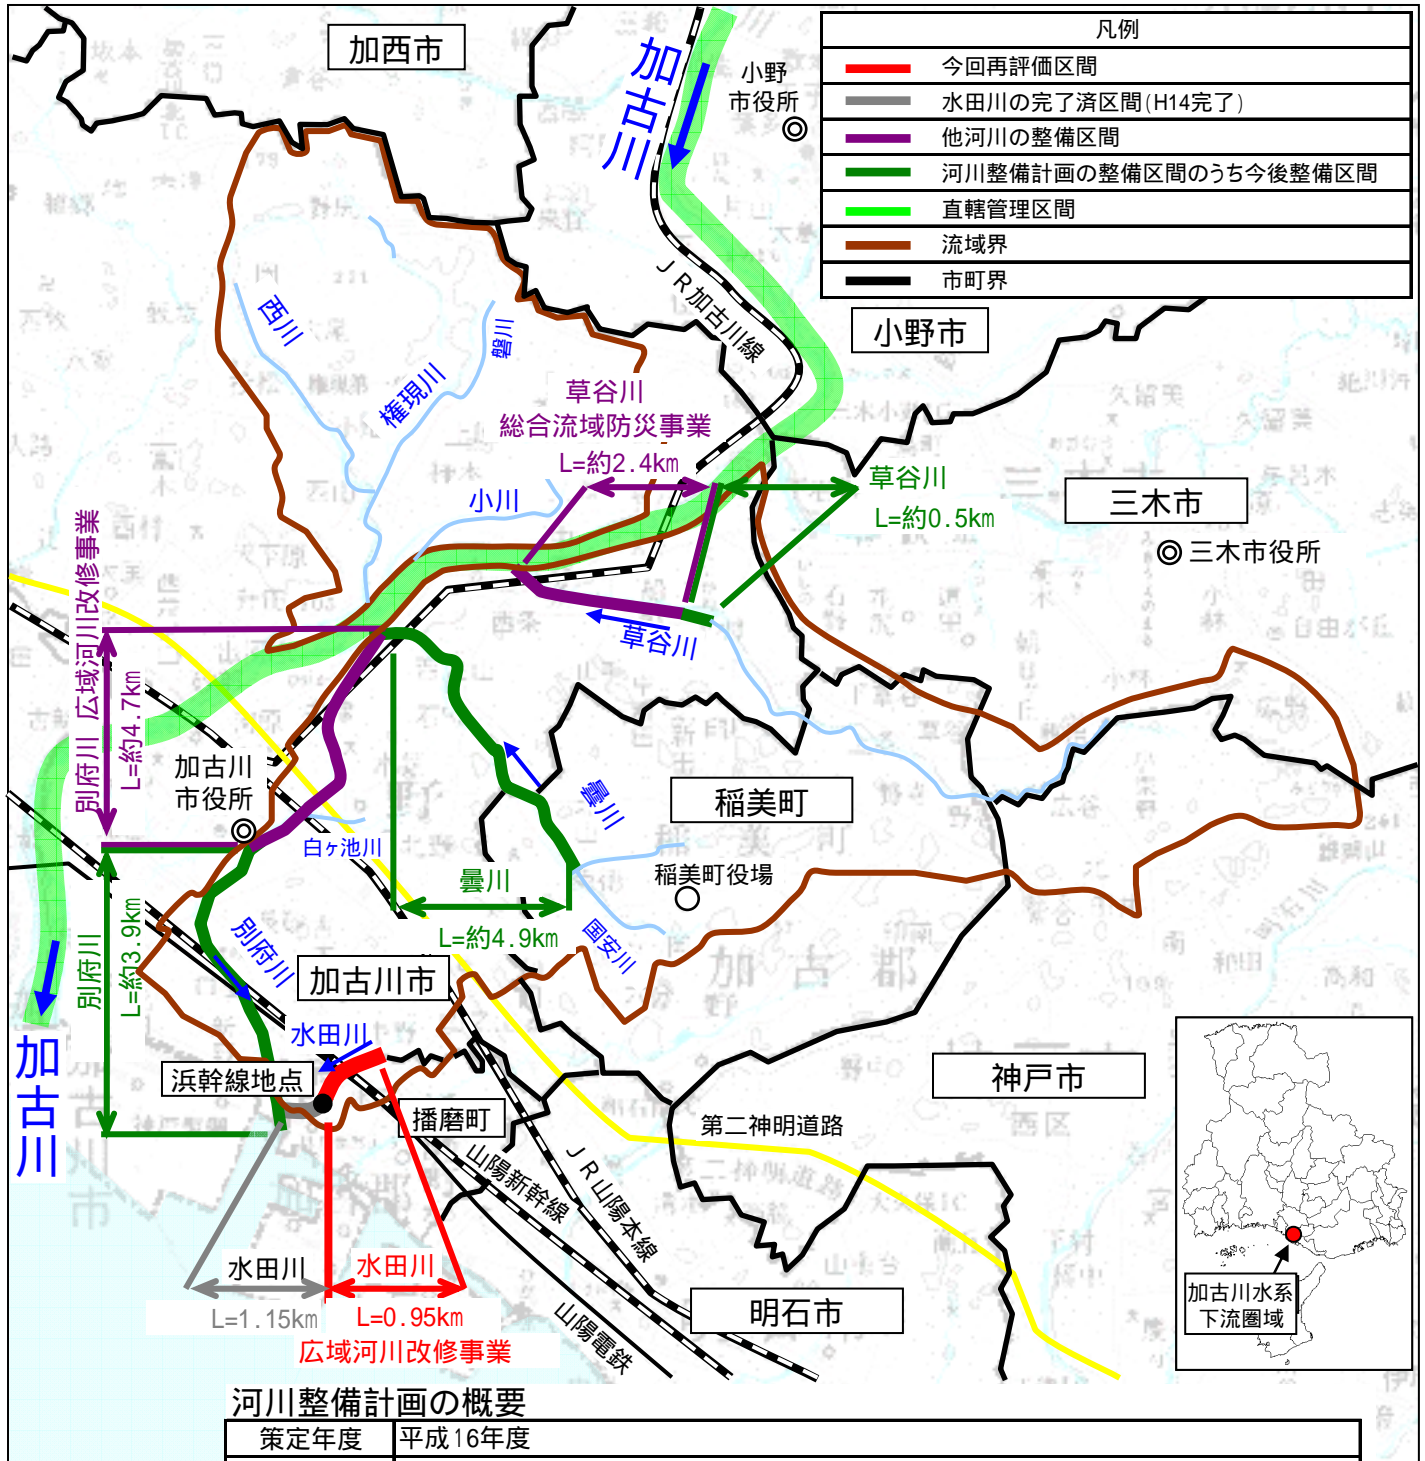

【一級河川 別府川 広域河川改修事業（水田川工区）】


[ 従前 ] 従前の整備内容での比較

	現計画	前回評価時点
事業採択年度	平成 15 年度	平成 15 年度
完成予定年度	平成 31 年度	平成 24 年度
総事業費	43 億円	43 億円
整備延長	950m	950m
整備区間	加古郡播磨町北本荘～加古川市平岡町中野	

[ 今後 ] 河川整備計画に即した整備内容の比較

	現計画	前回評価時点
河川整備計画策定年度 (事業採択年度)	平成 16 年度	平成 16 年度
完成予定年度	平成 31 年度	平成 24 年度
総事業費	43 億円	43 億円
整備延長	950m	950m
整備区間	加古郡播磨町北本荘～加古川市平岡町中野	

着手年度の変更のみである。

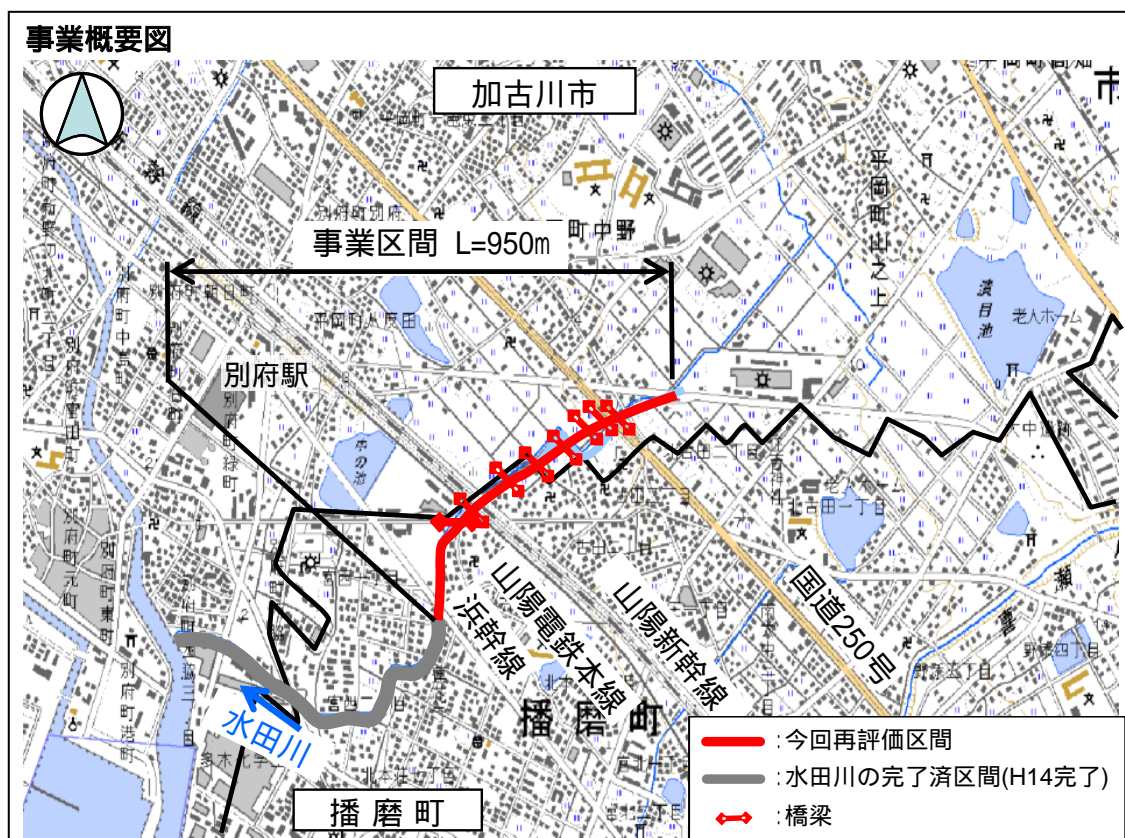

**事業変遷**

平成 2 年：台風 19 号洪水（浸水家屋 298 戸）

平成 14 年：事業評価（新規評価）

平成 15 年：広域河川改修事業着手（L=950m 町道浜幹線～法河川上流端）

平成 16 年：台風 23 号洪水（浸水家屋 40 戸）

加古川水系下流圏域 河川整備計画策定  
（水田川 L=950m 町道浜幹線～法河川上流端）

平成 23 年：台風 12 号洪水（浸水家屋 41 戸）

□：今後の事業として位置付け
