



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

令和3年6月24日(木) 発行
【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695
用地課 TEL:0796(82)5683

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。各工区で橋梁等の工事に着手していきます。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

釜屋地区

釜屋地区では5月から斜面掘削に取り掛かるための準備として、木の伐採(①)を行い、6月からは切土・橋台・橋脚工事(②)に着手しています。



工事用車両が出入りすることがありますが、交通誘導員を配置し、安全最優先で工事を進めていきます。



栢谷地区

昨年度より工事着手していた新温泉浜坂IC内の橋台工事がまもなく完成します(①)。これに続き、7月以降は国道178号の東西4基の橋脚工事に着手します(②)。

また、戸田地区ではトンネル工事の準備を進めており、今秋以降トンネル本体の掘削に着手します。

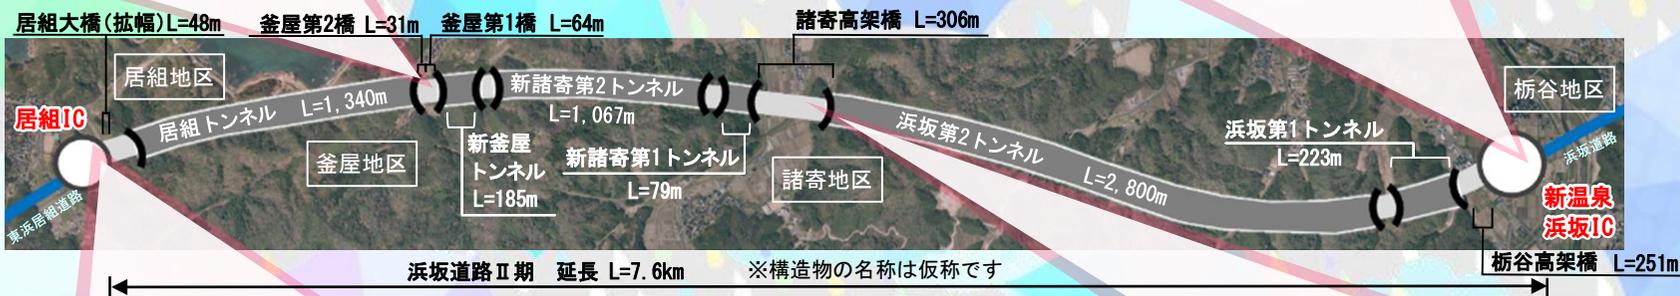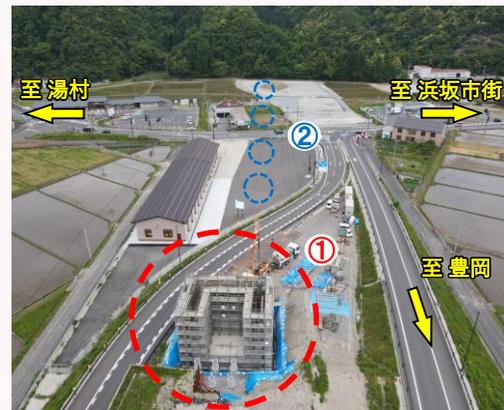

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

居組地区

IC入口および正面の山の法面掘削工事が一部完了(①)いたしました。今年度も引き続きIC入口周辺の山の法面掘削工事(②)を行っていく予定です。



諸寄地区

昨年度末より行ってきた大栃川を渡る工事用仮橋の設置が完了(①)しました。

7月以降、橋脚工事、JR高架下の拡幅工事、仮橋乗り入れのための県道かさ上げ工事(②)、諸寄浄化センター奥の切土工事に順次着手予定です。

