



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

令和4年3月24日(木) 発行
【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695
用地課 TEL:0796(82)5683

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。橋梁等を各工区で工事中です。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。



釜屋地区

釜屋地区では、橋台工事を行っており、橋台4基中3基(①)が令和4年3月末に完了します。引き続き、残り1基の橋台工事(②)と擁壁部の工事(③)の施工を進めていきます。①、②の工事完了後は引き続き橋桁を架ける工事を行う予定です。



栃谷地区

栃谷地区では、高架橋の橋脚4基(①)が完成しました。新温泉浜坂ICで降りるときには、迫力ある橋脚の姿を見ることができます。これからは、農道が浜坂道路の下をくぐるようになるためのBOXカルバートの施工や鳥取側へ延伸するための切土工事に着手します。

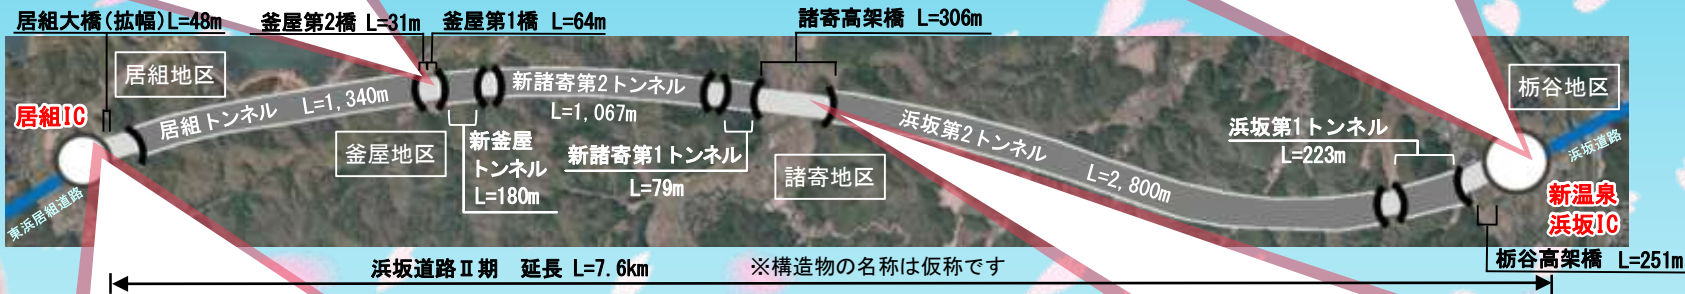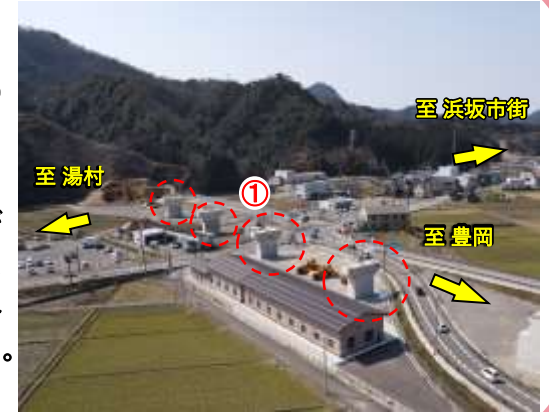

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

居組地区

居組地区では、居組ICに入って左手側に居組トンネルを建設予定であり、その前準備として全12段の切土を計画しています。令和2年11月から現場着手し、令和3年末で上から6段目まで完成しました。現在はさらに2段を切土するよう工事しています。



諸寄地区

昨年から工事をしてきた4基の諸寄高架橋橋脚のうち1基(①)が完成しました。残る3基の橋脚(②)は今年の夏までに完成予定です。釜屋側の山切り工事(③)も順調に進んでいます。また、春からは浜坂側へ繋がるトンネル工事のために、鋼材を組立てて工事用スロープの設置を行う予定です。

