



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5693
用地課 TEL:0796(82)5683

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。橋梁等を各工区で工事中です。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


釜谷地区

釜屋地区では現在、擁壁部の工事を行っています。4基の橋台工事(①)は5月末に完了しました。擁壁部の工事(②)は7月末に完了する予定です。7月末以降は橋を架ける工事、トンネル工事を行います。重機の搬入等ありますが、安全に配慮しながら工事を進めていきます。



栢谷地区


5月から埋蔵文化財本発掘調査を開始しました。IC西側の山の尾根沿いに弥生～古墳時代のお墓等の遺跡があり、遺跡を詳細に調査し、記録・整理・保存をします。手作業で遺跡を傷つけないよう丁寧に掘っていきます。

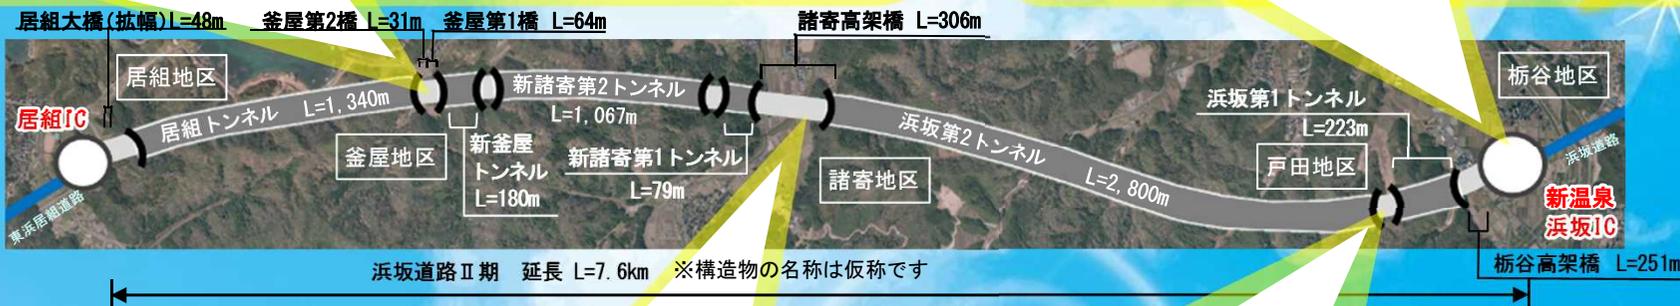

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

諸寄地区

諸寄高架橋の4基の橋脚(①)の完成が目前となりました。7月末には完成した背の高い橋脚が並ぶこととなります。また、浜坂側へ続くトンネルの入り口付近(②)の伐採作業が完了し、浜坂道路が通るルートがイメージがしやすくなりました。

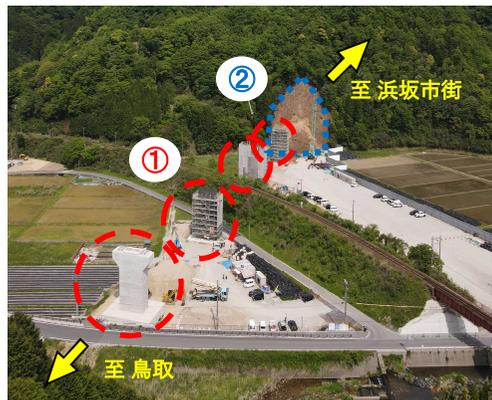

戸田地区

浜坂道路Ⅱ期事業の最長のトンネルである浜坂第2トンネルは延長2800mで、東西(戸田地区及び諸寄地区)の両方から掘削します。東工区は延長1528mで、昨年の12月から掘削を開始し、現在坑口から約400m付近まで掘削が進んでいます。

