

# 事後評価調書

## 【ほ場整備事業(用排水路整備)】

加古川市 やはた八幡地区

農政環境部  
農林水産局 農地整備課

# 事後評価調書

部課室名	農政環境部農林水産局 農地整備課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	農地整備課長 中島達也 (基盤整備班主幹 鶴崎俊則)	内線	4003 (4041)
------	---------------------	---------------------	-------------------------------	----	----------------

事業種別	用排水路整備	事業名	経営体育成基盤整備事業
------	--------	-----	-------------

事業区間	やはた 八幡地区 (加古川市八幡町 中西条、上西条、下村、野村、宗佐、船町、国包)				
------	--	--	--	--	--


事業期間	計画	平成19年度～平成23年度	事業費 (うち用地補償費)	計画	17億円 (0.2億円)
	実績	平成19年度～平成27年度		実績	14億円 (0.2億円)

完了年月	平成28年3月	過去の評価	平成18年度 新規評価
------	---------	-------	-------------



事業目的	事業内容
<p>本地区では、ほ場整備完了後30年以上が経過して土地改良施設が老朽化し、維持管理と水管理に多大な労力が必要となり農業経営に大きな負担となっている。</p> <p>このため、本事業により用水路のパイプライン化、排水路の更新整備を行うとともに、認定農業者への農地の利用集積を進めることにより、地域の農業生産の効率化や安定した農業経営の確立を目指す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備内容 用水路工(パイプライン) 30.7km</li> <li style="padding-left: 20px;">排水路工 5.0km</li> <li style="padding-left: 20px;">暗渠排水工 3.8ha</li> <li>・事業主体 兵庫県</li> <li>・負担割合 国 : 50%、 県 : 27.5%</li> <li style="padding-left: 20px;">市 : 11.25%、 地元: 11.25%</li> </ul>

## ●事業の概要

### 1 位置図

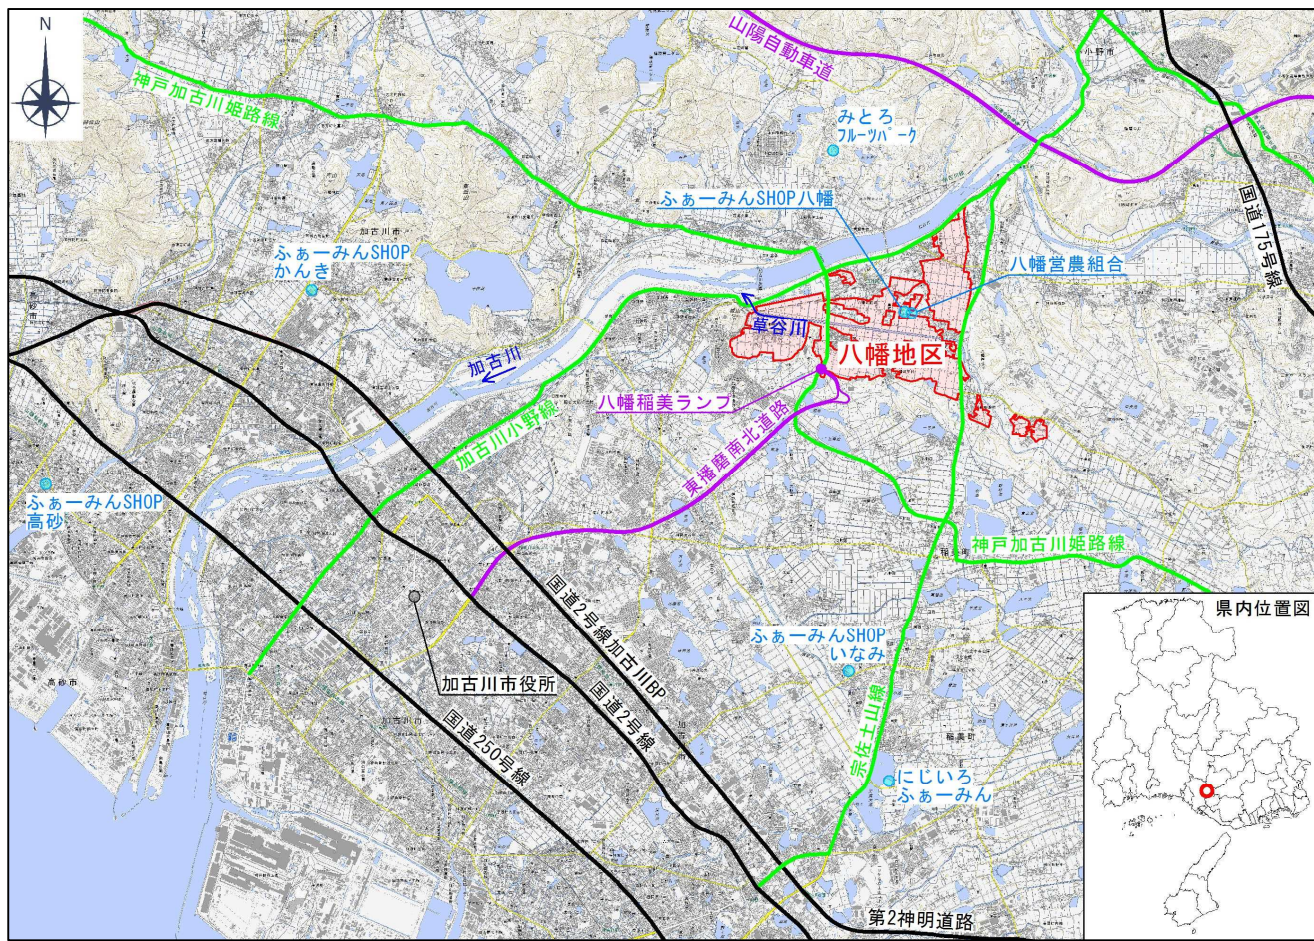

# 八幡地区 平面図

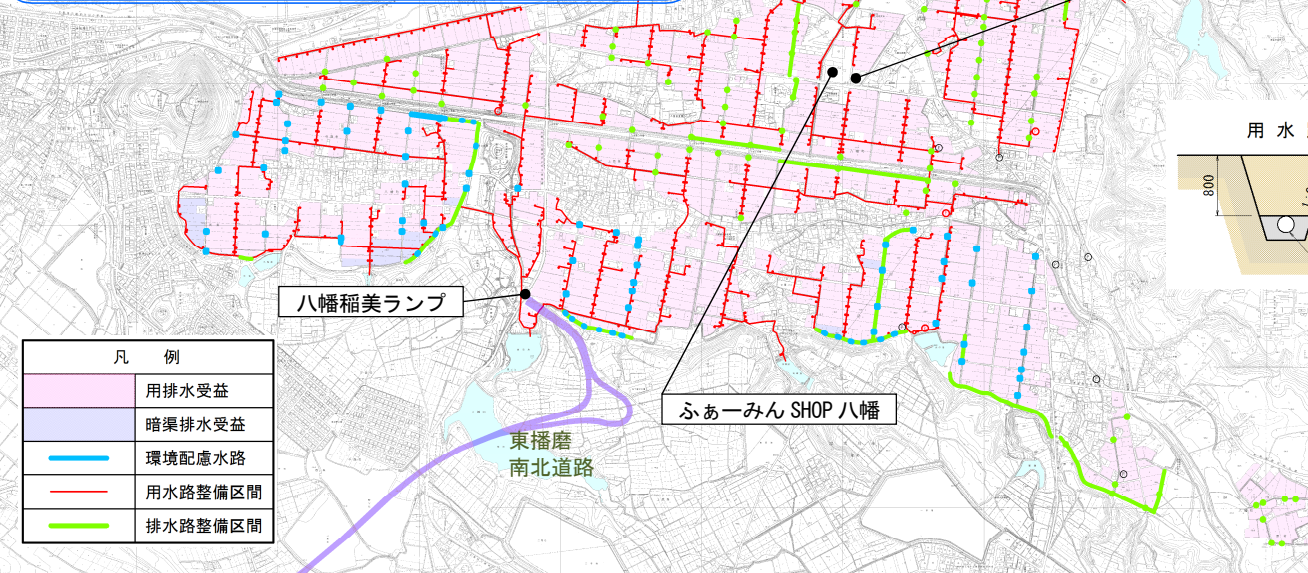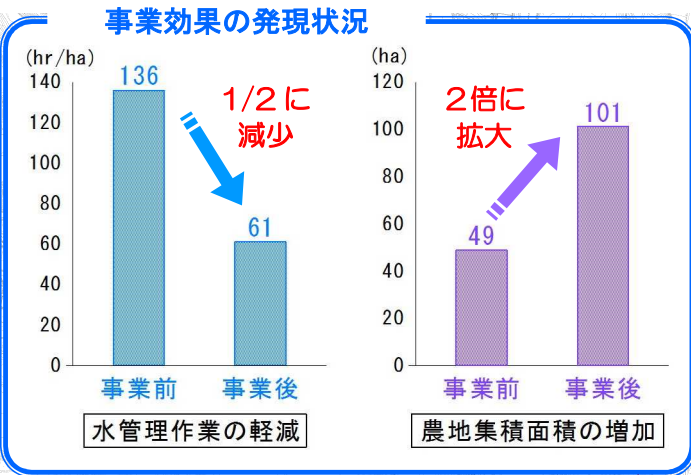

凡 例	
<span style="background-color: #FFDAB9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	用排水受益
<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	暗渠排水受益
<span style="color: blue; font-weight: bold;">—</span>	環境配慮水路
<span style="color: red; font-weight: bold;">—</span>	用水路整備区間
<span style="color: green; font-weight: bold;">—</span>	排水路整備区間


## 整備前



## 整備後



### 標準構造図

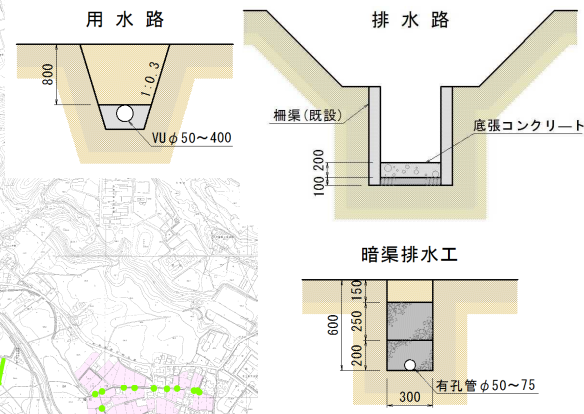

### 標準区画割図

